

**Fióktelep:**

2100 Gödöllő Ganz Á.u.2.

**Ügyintéző:** Rottár I. Ottó

**Iktató szám:**G101/2015/É

**Tel:** 28/536-000

**Fax:** 28/536-536

**HIDROKULTÚRA Kft.**

Budakeszi

Rákóczi u. 55.

2092

**Tárgy:** Gödöllő, szennyvízelvezető rendszer bővítése. Marika telep; Antalhegy: Kerengő, Kankalin, Hóvirág, Kökény, Lomb, Mályva, Erdőszél, 6492 hrsz-ú, és 4021/6 hrsz-ú utcák.

A közműegyeztetésre benyújtott **02-2/2006** tervszámú és **3.1, 3.2, 3.3** rajzszámú tervdokumentációt megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tervezett kiviteli munka

### érinti

az INVITEL Távközlési Zrt. tulajdonában és a fenntartásában lévő távközlési optikai és fémvezetőjű alépítmény és kábel hálózatot.

Jelen nyilatkozatunk csak a bemutatott tervekre érvényes. Amennyiben a kiviteli munkák a bemutatott tervtől eltérnek, úgy az eltérésről újbóli közműegyeztetést kell végezni az INVITEL Távközlési Zrt.-nél.

**Meglévő hálózatunk nyomvonalától a szabványos védőtávolságot be kell tartani. (min.: 0,50 m.), keresztezése csak alulról történhet.**

**A munkálatok az érintett területeken kizárólag szakfelügyelet mellett végezhetőek!**

**A szakfelügyeletet a fenti címen Társaságunk hálózatos osztályánál (Bathó Tibor, tel: 06-20-9278-230, fax: 06-27-536-140) munkálatok megkezdése előtt legalább 8 nappal kell megrendelni.**

Felhívom a kivitelező figyelmét, hogy a jegyzőkönyvben foglaltak be nem tartásából adódó rongálás jogi következményei a kivitelezőt terhelik!

A létesítmény építése során az MSZ 7487/2-80 és az MSZ 7487/3-80.sz. közműrendezési szabvány előírásait be kell tartani és a távközlés részére fenntartott helyet szabadon, kell hagyni.

A távközlő létesítmények védelme érdekében a munkálatok megkezdése előtt feltárásuk szükséges, ezért 50 méterenként, vagy a körülményektől függően sűrűbben kutató gödröket kell ásni.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a távközlési szakfelügyelő jelenléte nem mentesíti a kivitelezőt a felelősség és a kártérítési kötelezettség alól, ha a munkavégzés során a távközlő létesítmény megsérül.

A távközlő létesítmények sértetlenségét mindenképpen biztosítani kell, ezért a nyomvonaltól számított 2-2 méteres távolságon belül gépi földmunka még szakfelügyelet jelenlétében sem végezhető.

A feltárt kábeleket, csöveket az elmozdulás ellen biztosítani kell.

A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrizetéről, vagy annak legalább 30 cm-es ideiglenes földtakarásáról a kivitelezőnek gondoskodnia kell. A munka befejezése után a talajt eredeti állapotának megfelelően tömöríteni kell.

A távközlő fedlapokon anyagot tárolni nem szabad, azokat 2-2 m-es körzetben szabadon kell hagyni. A nyomvonalon csak olyan mennyiségű anyag tárolható, amit a távközlés kérésére a kivitelező 1 órán belül el tud távolítani.

Továbbá biztosítani kell a Távközlési Üzem részére takarás előtt a keresztezések /távközlési kábel-közművezeték/ szabványos kialakításának ellenőrzését. A takarás elvégzéséhez az üzem hozzájárulását meg kell kérni.

A fentiek fenntartása mellett az építési engedély kiadásához és a kivitelezéshez hozzájárulunk.

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes.

Gödöllő, 2015-04-13

**invitel**

Invitel Távközlési Zrt.  
2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.  
Fióktelep: 2151 Fót, Szent Benedek lakópark 69.  
Adószám: 12069316-2-44  
182.



-----  
Rottár I. Ottó  
Műszaki nyilvántartó



Dátum: 2015.04.14.

Nr: 218709/1

**Címzett:** HIDROKULTÚRA Kft.  
2092. Budakeszi, Rákóczi u. 55.

Cím, egyeztetett terv: Közműegyeztetés: Gödöllő, Marikatelep és Antalhegy  
szennyvízcsatornázása Tervsz.:02-2/2006

Átadott rajzok:

## K Ö Z M Ű N Y I L A T K O Z A T

### A közműnyilatkozat érvényessége 6 hónap!

**A tervezett munkák érintik** az ELMŰ Hálózati Kft. létesítményeit.

Érintett feszültségszintek	1 kV földkábeles csatlakozó, 1 kV közvilágítási légvezeték, 1 kV szabadvezeték, 20 kV szabadvezeték
Érintett terület	Gödöllő Marikatelep és Antalhegy Szennyvízcsatornázás

Tervsz.:02-2/2006

**A létesítményeink keresztezéséhez, megközelítéséhez az MSZ 7487/2, 3 /Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen térszint alatt, térszint felett/ MSZ 13207/2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége/, MSZ 151-1/2000 /Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ MSZ 151-8/2002 /Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ számú szabvány előírásai kötelező érvényűek.**

A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet értelmében tilos:

- A villamosmű üzemeltetőjének hozzájárulása nélkül a föld felszíne alatti és feletti tevékenység végzése, mely az élet- és vagyonbiztonságot, illetőleg a villamosmű folyamatos biztonságos üzemét veszélyezteti, illetve veszélyeztetheti.

Meglévő villamosmű biztonsági övezetébe eső létesítmény építése esetén az új létesítmény beruházója, illetőleg építtetője köteles gondoskodni:

- A villamosmű üzemeltetőjének hozzájárulásának megszerzéséről.

**A munka végzése során be kell tartani a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat.**

**Az engedélyezési tervhez a fentiek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk.**

**A közcélú villamos hálózat érintettsége esetén kérjük a fent felsorolt szabványok előírásainak megfelelő szabványossági felülvizsgálatok elvégzését a megközelítésekre és keresztezésekre vonatkozóan (szükséges esetén szakági tervező bevonásával). Amennyiben ezek alapján a közcélú villamos hálózaton áthelyezés, kiváltás szükséges, úgy az átalakítás műszaki tartalmát Társaságunk Hálózat Csatlakozási Osztályával szükséges egyeztetni (1132 Budapest, Váci út 72-74; e-mail: halozatkivaltas@elmu.hu, tel: 06-1-238-1574).**

**A tervezett létesítménnyel érintett, a Társaságunk üzemeltetésében lévő hálózatok és berendezések biztonsági övezetét érintő munka esetén, a hálózatunk védelmére vonatkozó, a villamosmű biztonsági övezetében végzett munkavégzés módjára kitérő műszaki leírást kérünk benyújtani, az ELMŰ Hálózati Kft. Pesti Régiójában (Budapest, Megyeri út 118., tel.: 238-3355).**

Cégnév: ELMŰ Hálózati Korlátolt Felelősségű Társaság • Rövid cégnév: ELMŰ Hálózati Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság • Cégjegyzékszám: 01-09-874142



A műszaki leíráshoz mellékelni kell minden olyan adatot, dokumentációt és részlet tervet, amely a vonatkozó szabvány(ok) által előírt feltételek teljesülését egyértelműen igazolja. (Ahol a tervezett létesítmény a tulajdonunkban levő hálózat nyomvonalát keresztezi, vagy megközelíti)

## JÓVÁHAGYOTT KIVITELI TERVEK HIÁNYÁBAN AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK VÉGREHAJTÁSÁHOZ NEM JÁRULUNK HOZZÁ!

**Amennyiben az egyeztetés során a nyomvonalat az egyeztető a saját rajzára átvezeti, úgy az átrajzolás minőségéért, helyességéért semminemű felelősséget nem vállalunk!**

A Társaságunk üzemeltetésében lévő földkábel hálózatok nyomvonalán, illetve attól 120 kV-on +- 1,5 m-re, 35 kV-nál nem nagyobb feszültségen, +1,0 m-re, valamint a szabadvezeték-hálózat valamint közvilágítás tartószerkezetétől - minden irányban - 3 m-re gépi földmunkavégzés biztonsági okokból nem végezhető (csak óvatos kézi földmunka végezhető)! Ezen előírás megszegése esetén minden felelősség - alvállalkozó esetében is - a földmunkát végzőt terheli.

A kivitelezés megkezdése előtt, a munkavégzés időtartama alatt a Társaságunk illetékes üzemeltetőjétől szakfelügyeletet kell kérni. A szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt 15 munkanappal, írásban kell megrendelni, melyben közölni kell a kivitelező nevét és a munka megkezdésének pontos időpontját, valamint a szakfelügyelet költségét viselő bankszámla számát. A régiók illetékes referensei minden esetben eldöntik a szakfelügyelet szükségességét.

Az építési munka megkezdése előtt 15 munkanappal írásban be kell jelenteni a munkát a Társaságunk Pesti Régiójában (Budapest, Megyeri út 118., 238-3357).

Amennyiben a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, földalatti vezetékre, vagy arra utaló nyomra (pl. védőborításra, kábelvédő csőre) bukkannak, a munkát azonnal abba kell hagyni és a vezeték üzembentartójának megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi szempontból biztosítani kell (pl. munkagödör megközelítését meg kell akadályozni). A munkát folytatni csak a vezeték üzembentartójának hozzájárulásával szabad.

### FIGYELEM!


**Kábelsértés esetén a 06-1-238-3509 telefonszámon kell azonnal értesíteni az áramszolgáltatót.**

**Káreseti jegyzőkönyvek felvételénél a kivitelező, vagy alvállalkozó illetve kárt okozó és az üzembentartó képviselője kell, hogy jelen legyen, ahol ellenőrzésre kerül a kiadott közműegyeztetett rajz és nyilatkozat, valamint a munkakezdés bejelentése és a szakfelügyelt kéréséről szóló dokumentum.**

*A munkálatok által hálózatunkban és berendezéseinkben okozott károkért és balesetekért az építtető és kivitelező egyetemlegesen teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.*

*A szakfelügyelet jelenléte nem mentesíti az elkövetőt a véletlen károkozás következményeitől.*

ELMŰ Hálózati Kft. Hálózati dokumentációs osztály		
Érvényes	2015 ÁPR 14.	+ 8 hónap
Közműegyeztető (Eidenpencz Aurélia) aláírása és a szolgálati hely pecsétje		
Ügyintéző:	<i>Eidenpencz Aurélia</i>	



Helyszíni szolgáltatások igazgatóság  
Nyugat-budapesti szolgáltatási központ

1073 Budapest Dob utca 78.  
1541 Budapest  
Tel: 1-462-1462 Fax: 1-462-1465

Ügyiratszám: 420366-53943043-1/2015  
Egyeztetés kelte: Budapest, 2015.04.17

**1 évig érvényes!**

## KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Beadvány azonosító: **02-2/2006**  
Tárgy jellege: **Szennyvízcsatornázás**  
Tárgy helyszíne: **2100 Gödöllő Marika telep és Antalhegy**  
Tárgy:

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat jellege:

Alépitmény

Földkábel

Földfeletti

Nincs

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>
körzet hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>
gerinc hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>
zárt célú hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>

A közműegyeztetési jegyzőkönyvvel együtt kiadásra került a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozata.

A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

A szakhatóságok felé, építési engedély kiadásához a közműkezelői nyilatkozatot kell a beadványhoz csatolni!

Ezen közműegyeztetési jegyzőkönyv NEM pótolja a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozatát!

Egyeztetés kelte: Budapest, 2015.04.17



MAGYAR TELEKOM NYRT. Ph.  
Helyszíni Szolgáltatások Igazgatóság  
Nyugat-budapesti szolgáltatási központ

EGYÜTT. VELED

Balogh Zsuzsanna  
a Magyar Telekom Nyrt. közműegyeztetője

Jelen közműegyeztetési jegyzőkönyvünk átvételét a közműegyeztető ügyfelünk aláírásával elismeri, és vállalja annak továbbítását megbízója felé. Egyben tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési jegyzőkönyv és közműkezelői nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk.

Hidro-kultúra Kft.

Pál János +36309330350

egyeztetést kérő szervezet neve

egyeztető Ügyfél neve (olvashatóan) és telefonszáma

.....  
egyeztető Ügyfél aláírása

Magyar Telekom Nyrt.

Ügyfélfogadás: Hétfő 9.00-18.00, Szerda 9.00-16.00, Péntek 9.00-12.00





Helyszíni szolgáltatások igazgatóság  
Nyugat-budapesti szolgáltatási központ

1073 Budapest Dob utca 78.  
1541 Budapest  
Tel: 1-462-1462 Fax: 1-462-1465

Hidrokultúra Kft.  
Budakeszi  
Rákóczi Ferenc utca 55.  
2092

Ügyiratszám: 420366-53943043-2/2015  
Ügyintéző: Balogh Zsuzsanna  
Telefon: 1-462-1462  
Telefax: 1-462-1465  
E-mail cím:  
Melléklet:

## KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 02-2/2006  
Tárgy jellege: Szennyvízcsatornázás  
Tárgy helyszíne: 2100 Gödöllő Marika telep és Antalhegy  
Tárgy:

### Tisztelt Címzett!

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott terveit megkaptuk. Megállapítottuk, hogy a tervezett létesítmény

**Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő távközlési hálózatot NEM érint.**

Tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a

**közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.**

Záradék; Az üzemeltetői nyilatkozat érvényessége: 2016.04.16  
Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Budapest, 2016.04.17

EGYÜTT. VELED

Üdvözlettel,

MAGYAR TELEKOM NYRT.  
Helyszíni Szolgáltatások Igazgatóság  
Nyugat-budapesti szolgáltatási központ  
Közműkezelés

10

A tervezett munka ÉRINTI az Invitel Távközlési Zrt. létesítményeit, ezért csak távközlési szakfelügyelet jelenlétében végezhető. A szakfelügyeletet a kivitelezés megkezdése előtt 10 nappal az Invitel Távközlési Zrt. hálózatüzemeltetési osztályánál kell megrendelni.

2015 ÁPR 13

eredeti példányt átvettém

A tervezett építési tevékenység érinti a TIGAZ-DSO Kft. létesítményeit és annak biztonsági övezetét, ezért a kivitelezési munka megkezdése előtt társaságunk szakmai felügyelete mellett a keresztvezeték nyomvonalát és biztonsági övezetét a kivitelezőnek ki kell jelölni.

A szakmai felügyeletet a kijelölés tervezett időpontja előtt 8 nappal a TIGAZ-DSO Kft. Földgázelosztás ..... Területi Egységétől kell írásban megrendelni. Jelen egyeztetés a ..... Szantú nyilatkozatunkkal együtt érvényes.

Kelt: 2015 ÁPR 13

TIGAZ-DSO Kft. egyeztetésnek neve és aláírása

A tervezett munkák érintik az ELMŰ Hálózati Kft. hálózatát. A villamosmű biztonsági övezetébe történő behatolás módjára, a megközelítések és keresztvezetések kialakítására a vonatkozó előírások szerinti kiviteli tervekét kérjük, hogy a beruházó készíttesse el, és jóváhagyásra szíveskedjen bemutatni. Jóváhagyott tervek hiányában a biztonsági övezetbe történő munkavégzéshez nem járunk hozzá. Jelen záradék „köznyilatkozat”-tal együtt érvényes.

## Jelmagyarázat:

1, 10, 20, 30, 35, 120 KV-os hálózatot ill. hírközlő kábelt.

- Gk — — — — — meglévő vízvezeték
- V — — — — — meglévő vízvezeték
- Te --- meglévő telefonálmű
- Sz --- meglévő szennyvízcsatorna
- SZNY --- meglévő nyomott szennyvízvezeték
- ← Efv → elektromos földkábel E 11kV
- T --- meglévő telefonkábel


<b>ELMŰ Hálózati Kft.</b> Hálózati dokumentációs osztály		
Érvényes:	<b>2015 ÁPR 14.</b>	+ 6 hónap
Tel.: 06-1/238-1940; Fax: 06-1/238-1949		
Ügyintéző:	E.	



**HELYSZINI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG**  
Nyugat-budapesti szolgáltatási Központ  
KÖZMŰEGYEZTETÉS  
Cím: 1073 Budapest, Dob u. 76.  
Postacím: 1541 Budapest  
Tel.: (1) 462 1462 Fax: (1) 462 1465

Kelt: 2015 -04- 17

**A TERVEZETT MUNKA A HÁLÓZATUNKAT NEM ÉRINTI**  
A kiviteli terven szereplő adatok helyességéért a tervező a felelős.  
Munkakezdés bejelentés, szakfelügyelet: alepitmeny@telekom.hu  
Távközlési közmuvegyeztetésünk a csatlótt Közmuvegyeztetési jegyzőkönyvvel és Közmuvezelői nyilatkozattal együtt 1 évig érvényes,

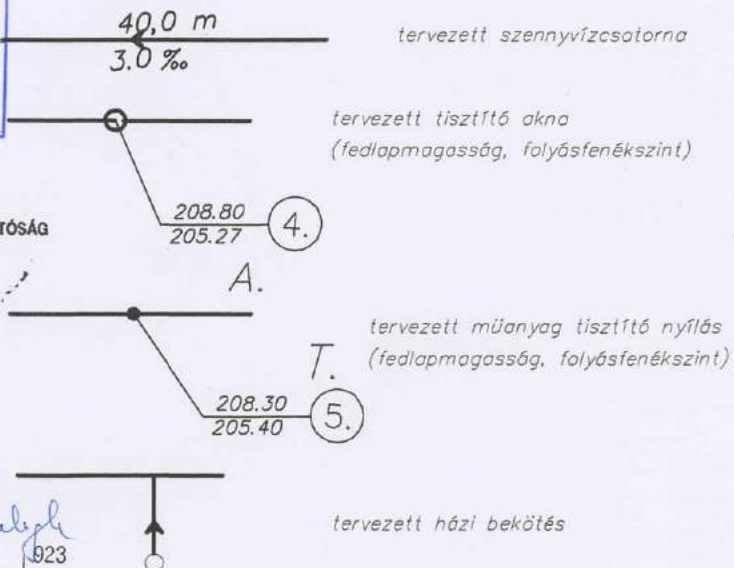

## Aktualizált terv!

Tsz: 02-2/2006		<b>Hidrocultúra</b> Víz- és környezetgazdálkodási Kft. 2092 Budakeszi, Rákóczi u. 55.	
A terv tárgya: Gödöllő, Marika telep és Antalhegy szennyvízcsatornázása engedélyezési terv			
Megbízó: Gödöllő Város Önkormányzata			
A rajz tárgya: Marika telep, MT 1-0-0. és MT 1-1-0. sz. csatornák helyszínrajza			
Tervező:	Méretarány:	Dátum:	Rajzszám:
Pál János	1:500	2015. 03. hó	3.1



A tervezett munka ÉRINTI az Invitel Távközlési Zrt. létesítményeit, ezért csak távközlési szakfelügyelet jelenlétében végezhető. A szakfelügyelet a kivitelezés megkezdése előtt 10 nappal az Invitel Távközlési Zrt. hálózatüzemeltetési osztályánál kell megrendelni.

2015. ÁPR. 13.  
Bredeti példányt átvettém

A tervezett munkák érintik az ELMŰ Hálózati Kft. hálózatát. A villamosmű biztonsági övezetébe történő behatolás módjára, a megközelítések és keresztezések kialakítására a vonatkozó előírások szerinti kiviteli terveket kérjük, hogy a beruházó készíttesse el, és jóváhagyásra szíveskedjen bemutatni. Jó áhálattal tervek hiányában a biztonsági övezetbe történő munkavégzéshez nem járunk hozzá. Jelen záradék „köznyilatkozat”-tal együtt érvényes.

Közműegyeztetve, ÉRINTI a  
1, 10, 20, 30, 35, 120 kV-os hálózatot ill. hírközlő kábelt.

Jelmagyarázat:

ELMŰ Hálózati Kft. Hálózati dokumentációs osztály		
Erőforrás:	2015. ÁPR. 14.	+ 8 hónap
Erőforrás:	meglévő vízvezeték	
To:	meglévő telefontelep (238-1949)	
SZ:	meglévő szennyvízcsatorna	
SZNY:	meglévő nyomott szennyvízvezeték	
EF:	elektromos földkábel	
T:	meglévő telefontelep	




HELYSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG  
Nyugat-budapesti szolgáltatási Központ  
KÖZMŰEGYEZTETÉS  
Cím: 1073 Budapest, Dob u. 78.  
Postacím: 1541 Budapest  
Tel.: (1) 462 1462 Fax: (1) 462 1465

Kelt: 2015-04-17

A TERVEZETT MUNKA A HÁLÓZATUNKAT NEM ÉRINTI  
A kiviteli terven szereplő adatok helyességéért a tervező a felelős.  
Munkakézés bejelentés, szakfelügyelet: ak.ritmeny@telekom.hu  
Távközlési közmuvegyeztetésünk a csatolt Közműegyeztetési jegyzőkönyvel és Közműkezelői nyilatkozattal együtt 1 évig érvényes.

A tervezett építési tevékenység érinti a TIGÁZ-DSO Kft. létesítményeit és annak biztonsági övezetét, ezért a kivitelezési munka megkezdése előtt társaságunk szakmai felügyelete mellett a keresztezést gazvezeték nyomvonalát és biztonsági övezetét a kivitelezőknek ki kell jelölni.  
A szakmai felügyeletet a kijelölés tervezett időpontja előtt 8 nappal a TIGÁZ-DSO Kft. Földgázelosztás... Területi Egységétől kell írásban megrendelni.  
Jelen egyeztetés a... számú nyilatkozatunkkal együtt érvényes.  
Kelt: 2015. ÁPR. 13.  
TIGÁZ-DSO Kft. területi igazgatója neve és aláírása

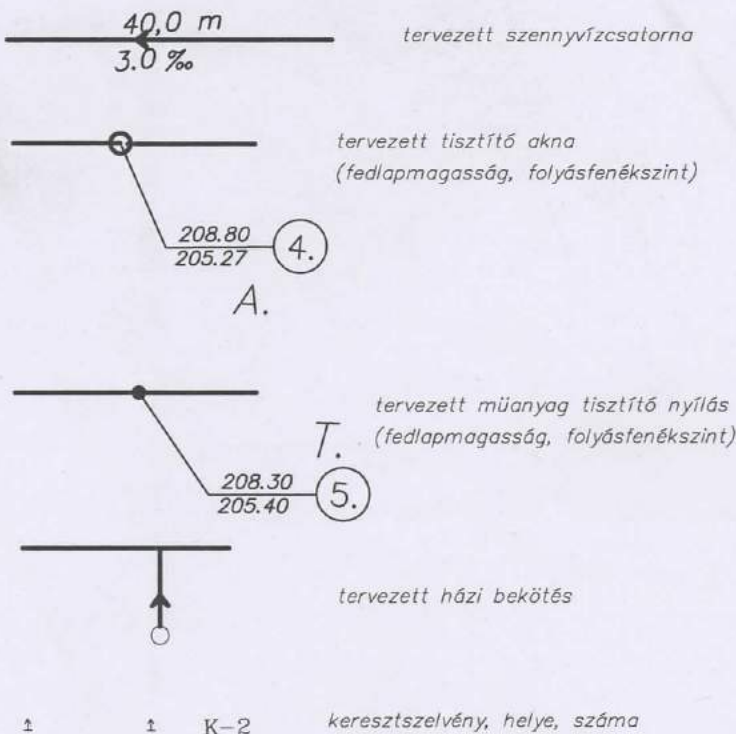

Aktualizált, módosított terv!

Tsz: 02-2/2006		Hidrokulturá Víz- és környezetgazdálkodási Kft. 2092 Budakeszi, Rákóczi u. 55.	
A terv tárgya:	Gödöllő, Marika telep és Antalhegy szennyvízcsatornázása Engedélyezési terv		
Megbízó:	Gödöllő Város Önkormányzata		
A rajz tárgya:	Antalhegy, 1-0-0, 1-1-0, 1-1-1, 1-1-2, 1-1-3. és 1-2-0. sz. csatornák helyszínrajza		
Tervező:	Méretarány:	Dátum:	Rajzszám:
Pál János	1:500	2015. 04. hó	3.2.



A tervezett munka ÉRINTI az Invitel Távközlési Zrt. létesítményeit, ezért csak távközlési szakfelügyelet jelenlétében végezhető. A szakfelügyeletet a kivitelezés megkezdése előtt 10 nappal az Invitel Távközlési Zrt. hálózattüzemeltetési osztályánál kell megrendelni.

2015. ÁPR. 13.

eredeti példányt átvettem

A tervezett munkák érintik az ELMŰ Hálózati Kft. hálózatát. A villamosmű biztonsági övezetébe történő behatolás módjára, a megközelítések és keresztezések kialakítására a vonatkozó előírások szerinti kiviteli terveket kérjük, hogy a beruházó készíttesse el, és jóváhagyásra szíveskedjen bemutatni. Jövőhagyott tervek hiányában a biztonsági övezetbe történő munkavégzéshez nem járunk hozzá. Jelen tájékoztató „köznyilatkozat”-tal együtt érvényes.

Jelen tájékoztató közleménygyeztetve, ÉRINTI a 1, 10, 20, 30, 35, 120 kV-os hálózatot ill. hírközlő kábelt.

**ELMŰ Hálózat Kft.**  
Hálózati dokumentációs osztály

Érvényes: **2015 ÁPR 14.** + 6 hónap

Tel.: 06-1/238-1940; Fax: 06-1/238-1949

meglévő vízvezeték  
Ugyintéző  
meglévő vízvezeték

Jelmagyarázat:

- E4--- meglévő vízvezeték
- V--- meglévő vízvezeték
- T--- meglévő telefonálépítmény
- SZ--- meglévő szennyvízcsatorna
- SZNY--- meglévő nyomott szennyvízvezeték
- E4--- elektromos földkábel **E 1 kV**
- T--- meglévő telefontávkábel

**HELYSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG**  
Nyugat-budapesti szolgáltatási Központ  
KÖZMŰEGYEZTETÉS  
Cím: 1073 Budapest, Dob u. 78.  
Postacím: 1541 Budapest  
Tel.: (1) 462 1462 Fax: (1) 462 1465

Kelt: **2015 -04- 17**

A TERVEZETT MUNKA A HÁLÓZATUNKAT NEM ÉRINTI  
A kiviteli tervben szereplő adatok helyességéért a tervező a felelős.  
Munkakezdés bejelentés, szakfelügyelet: alepitmeny@telekom.hu  
Távközlési közleménygyeztetésünk a csatolt Közleménygyeztetési jegyzőkönyvvel és Közműkezelői nyilatkozattal együtt 1 évig érvényes.

A tervezett építési tevékenység érinti a TICÁZ-DSO Kft. létesítményeit és annak biztonsági övezetét, ezért a kivitelezési munka megkezdése előtt társaságunk szakmai felügyelete mellett a keresztezett gázvezeték nyomvonalát és biztonsági övezetét a kivitelezőnek ki kell jelölni.  
A szakmai felügyeletet a kijelölés tervezett időpontja előtt 8 nappal a TICÁZ-DSO Kft. Földgázosztás Területi Egységétől kell írásban megrendelni.  
Jelen egyeztetés a ..... számú nyilatkozatunkkal együtt érvényes.  
Kelt: **2015 ÁPR. 13.**  
TICÁZ-DSO Kft. Egységfőjének neve és aláírása

40,0 m  
3,0 ‰  
tervezett szennyvízcsatorna

tervezett tisztító akna  
(fedlapmagasság, folyásfenékszint)

208.80  
205.27 (4.)

A.

tervezett műanyag tisztító nyílás  
(fedlapmagasság, folyásfenékszint)

208.30  
205.40 (5.)

T.

tervezett házi bekötés

± ± K-2 keresztiszelvény, helye, száma

Aktualizált, módosított terv!

Tsz: 02-2/2006		<b>Hidrocultúra</b> Víz- és környezetgazdálkodási Kft. 2092 Budakeszi, Rákóczi u. 55.	
A terv tárgya:	Gödöllő, Marika telep és Antalhegy szennyvízcsatornázása Engedélyezési terv		
Megbízó:	Gödöllő Város Önkormányzata		
A rajz tárgya:	Antalhegy, 2-0-0, 3-0-0, 3-1-0, 3-2-0. és 3-3-0. sz. csatornák helyszínrajza		
Tervező:	Méretarány:	Dátum:	Rajzszám:
Pál János	1:500	2015. 04. hó	3.3.
